


IIS 2020 - Gestión de proyectos

Ejercicios

- 1) Discuta, ¿Por qué gestionamos los proyectos?
- 2) Dado la siguiente WBS/EDT correspondiente a una aplicación web. Identifique los errores.

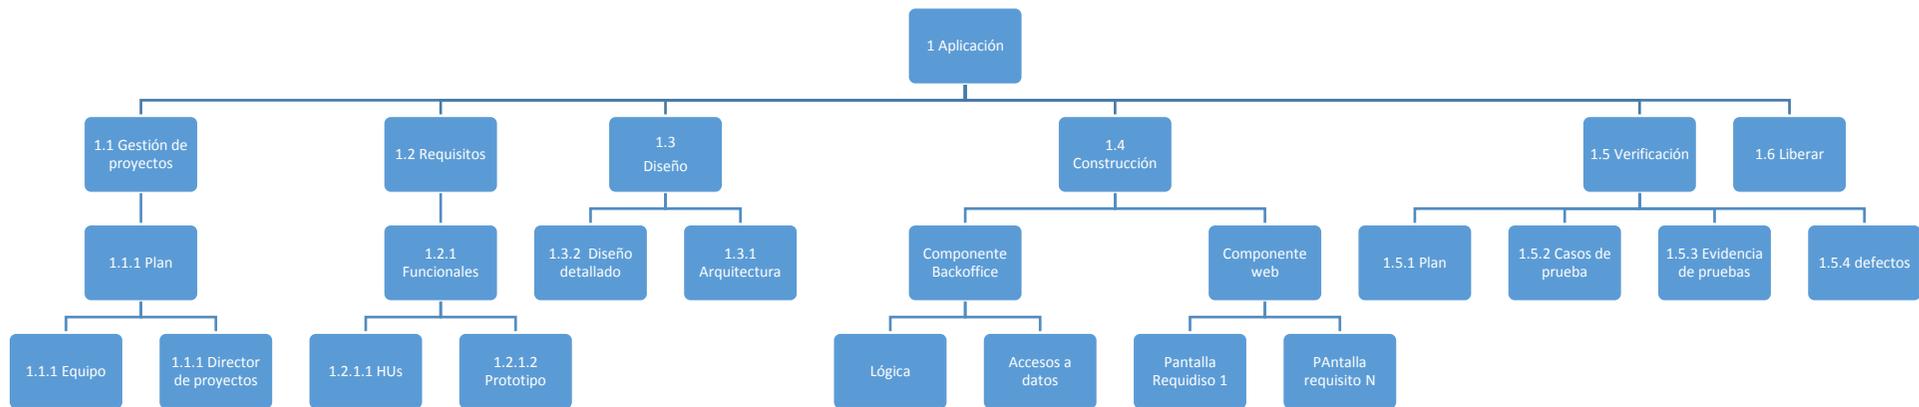

- 3) ¿Por qué son inexactas las estimaciones? ¿La incertidumbre es la misma durante todo el proyecto?
- 4) Si cuento con la siguiente estimación de las tareas de una iteración del proyecto y sus respectivas dependencias:

Tarea	Estimación (Horas)	Precedencia
A	8	No tiene
B	4	No tiene
C	2	A
D	0	C y B
E	6	D
F	14	B
G	24	E
H	8	G

Responda:

- ¿Cuánto es la duración de la ruta crítica? ¿qué actividades la componen?
- Desarrolle el cronograma asumiendo que cuenta con 2 personas para el proyecto. Una de ellas trabaja 8 horas y la otra 4 horas.
- Luego de haber desarrollado el cronograma ¿qué sucedió con la ruta crítica?
